Отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 9 месяцев 2025 года АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", вид деятельности: передача электрической энергии

| | Инфо | рмация о плановы | х и фактичес егулируемы | | к предоста | вления | | | | | | Информация финансиров | Информация о солоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|-----------------------|------------|---|---|----------------|-----------------|------------|---|--------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|
| | наименова ние чегулируем ых услуг и обслужива емая | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в на показа | | период предоставле ния услуги в рамках инвестицио нной | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге | | | | | собственные средства | | , тыс. тенге заёмные средства | бюджетные средства | сырья, ма топлива и натур вырах зависи утверж инвести | не расхода атериалов, и энергии в кальном жении в мости от кденной иционной раммы | (физич основны (активов), реализ зависим утверж | Снижение износа (физического) основных фондов активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) | | в зависимости от утверждённой программы (проекта) | | варийности по ализации в имости от ой программы оекта) | показателей в утверждённой инвестиционной | Оценка повышения качества и надёжности предостав ляемых регулируемых услуг |
| | герритория | | | план | факт | (проекта) | рограммы (проекта) | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль | | | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | программе | ,-,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | Услуги по передаче | Bcero | | | Kara Cara | 2025 | 6 366 924 | 8 700 165 | 3 421 655 | -5 363 706 | | 2 692 760 | 728 895 | 0 | 0 | 81,9 | 82,9 | ВЛ-63,6% | ВЛ-56,8% | 3,85 | 3,74 | технологи - | технологи - | 1) Увеличение потерь | "хорошо" |
| 1 | электричес кой энергии по сетям | Техническая модернизация ПС- 35 кВ и выше | шт. | 13 | 0 | | - | 2 698 088 | 257 788 | | Работы по ТМ продолжаются, ввод объектов в IV кв. 2025 года. Период окончания СМР по договору подряда-декабрь 2025 г. Работы по ТМ продолжаются, ввод объектов в IV кв. 2025 года. Работы по КР продолжаюся, завершение в IV кв. 2025 года. Работы по ТМ продолжаются, завершение работ в IV кв. 2025 года. | 361 618 556 595 719 | 0 | 0 0 | 0 | млн.кВтч | млн.кВтч | TIC-KTTI- 55,1 % | NC+KTN- 57,7% | | | ческие нарушения - 1 959 | ческие нарушения - 1 562 | (кВн) обусловлено ростом транзита а/энергии по сетям АО «АРЭК»; 2) Физический износ ОФ просчитывается экпертом, проводящим техническую экспертизу исполнения ИП, износ будет просчитан по окончанию 2025 г. Предоставлены фактические данные по итогам 2024 года; | , |
| 2 | АО "АРЭК" Акмолинс кой области | Строительство ВЛ 35 кВ и выше | км. | 55,5 | 0 | | | 709 569 | 19 231 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Техническая модернизация сетей 0,4-10 кВ | км/КТП/ реклоузер | 93,917/51/ 1 | 0 | | | 2 196 729 | 917 983 | -1 278 746 | | | 556 365 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Капитальный ремонт энергооборудова ния и ЛЭП | км/шт | 2434,6/647 | | | | 939 021 | 595 719 | -343 302 | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | | Техническуая модернизация оборудования и средств системы АСКУЭ | шт. | 292 | | | | 84 934 | 58 915 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | | Капитальный ремонт зданий и сооружений | шт. | 4 | | | | 171 761 | 171 761 137 091 | | Работы по КР продолжаюся, завершение в IV кв. 2025 года. | 137 091 | 0 | 0 | o | | | | | | | | | | |
| 7 | | Техническая модернизация, строительство средств связи | шт. | 85 | | | | 168 196 | 13 410 | -154 786 | ТМЦ поставлены в полном объеме, ТМ проводится в соотв. заключ. Договором, окончание работ в в IVкв. 2025 года. | . 13 410 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | | Замена трансформаторов 25-63 кВа | шт. | 6 | | | | 5 458 | 3 295 | -2 163 | Работы по замене тр-ров продолжаюся, завершени в IV кв. 2025 года. | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | | Приобретение измерительных приборов | шт. | 54 | | | | 10 095 | 3 020 | -7 075 | Поставка в IV кв. 2025 года. | 669 | 2 351 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | | Приобретение вычислительной техники, НМА | шт. | 206 | | | | 38 227 | 9 827 | -28 400 | Частичная поставка, окончание в IV кв. 2025 года. | 9 827 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11 | | Приобретение, КР спецтехники, автотранспорта, механизмов и оборудования | шт. | 29 | | | | 428 468 117 00 | 117 000 | -311 468 | Окончательная поставка до конца 2025 года | 117 000 | 0 | 0 | 0 | | - | | | | | | | | |
| 12 | | Выплаты по обязательствам | тыс. тенге | 0 | 100 | 2) Selection | 2004 | 1 249 619 | 9 619 1 118 197 | -131 422 | Выплаты по графику | 1 118 197 | 0 | 0 | 0 . | , 1 | | | | | 1 | | | | |

| | Инфо | рмация о плановы Г | іх и фактичес регулируемы | | ах предост | авления | 1 | Special Control of the Control of th | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной прогаммы (проекта), тыс. тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утверждёнными в инвестиционной программе (прокте) | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------------------------|--------------------|-----------------------|--|---|--|--------|--------|------------------------|---|---------|-------|-------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|---|--|
| N≘ n/n | наименова ние регулируем ых услуг и обслужива емая | наименование мероприятий | единица измерения | кол-во в и пока | натуральнь зателях | период предоставле ния услуги в рамках инвестицио нной программы | отчёт о прибылях и убытках, тыс. тенге | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | | | | собственные средства | | | 35.00 | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) | | по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) | | Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утверждённой программы (проекта) | | достигнутых фактических показателей от показателей в утверждённой инвестиционной | Оценка повышения качества и надёжности предостав ляемых регулируемых услуг | |
| | территория | | | план | факт | (проекта) | | план | факт | откл. | причины откл. | амортизация | прибыль | • | | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | программе | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 13 | | Тех.обслед., ПСД объектов 2025 г | шт. | 0 | | | | 0 | 84 983 | 84 983 | | 0 | 84 983 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Прочие OC | шт. | 0 | 0 | | | | 0 | 2 286 | 2 286 | Мероприятия будут вкючены в проект | 0 | 2 286 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 15 | | Проектные работы, ЭУР, тех.обслед. объектов Нац.проекта | шт. | 0 | | | | 0 | 82 910 | 82 910 | — изменений ИП-2025 г. | o | 82 910 | | | | | | | | | - | | | | |

^{*} АО АРЭК", в соответствии с п.361 ПФТ №90, готовит заявление об изменении ИП 2025 года в рамках утвержденной суммы.

Генеральный директор

А. Павлов

30" октября 2025 года

1. 35

110/35/6 « » 35

















35/10 « »
35 35 ,
35 ,

















35 ,

35































35 , 10

35









110/10 « » 110 , 10

























, 110 , 35 , 110






















35/10 « »

10 , 35 ,

, - , 35

10 10



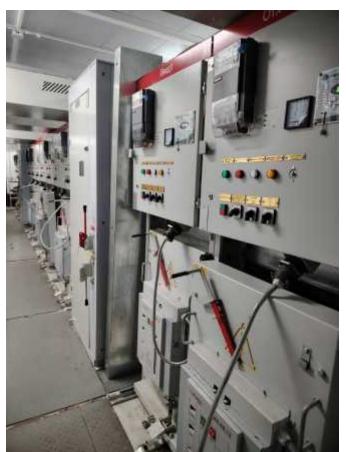



































110/35/10 110

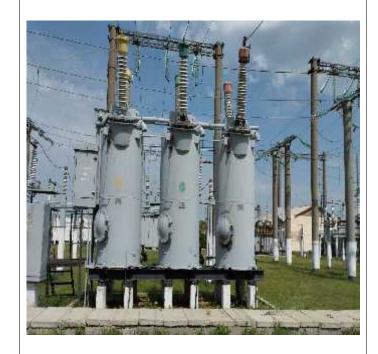



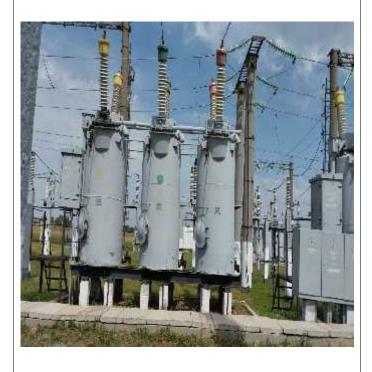












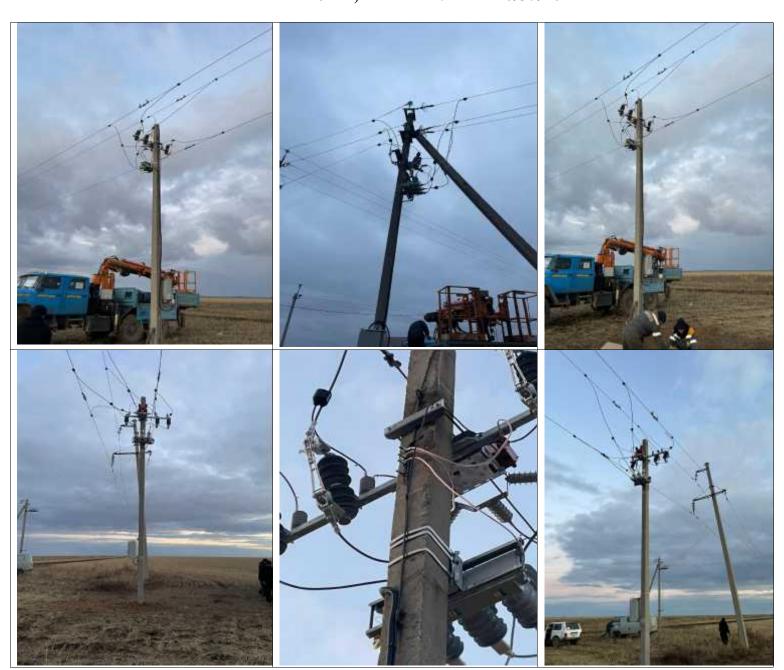




-0,4 , 10/0,4 -4





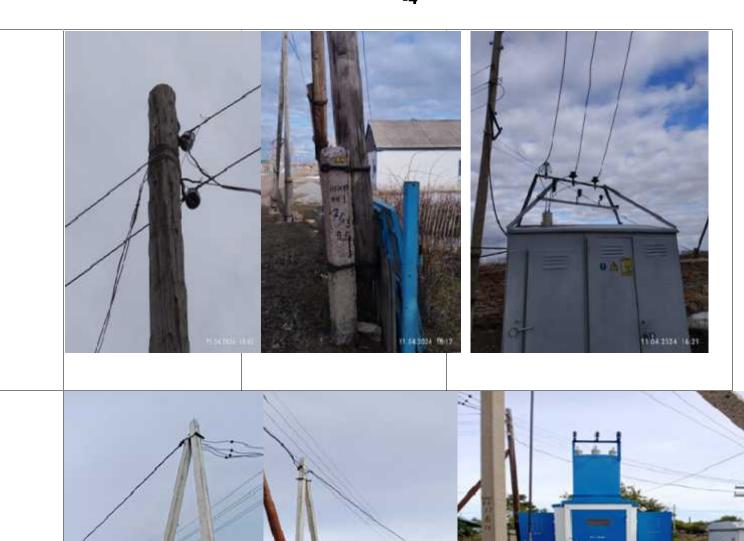





.4









-82-1 - -08 330 650 150



DELL Vostro 3520 (210-BECX-2)



- 711 R TX IP P RS Z (5-60 220)



4- 720 R TX IP P RS G/PLC (10-100 3 220/380)



4 - 720 R TX IP RS G/PLC (3x220/380V 5-7,5A)



234 ARTM2-01 PBR.G



234 ARTM2-03 PBR.G











5. ,











(38)

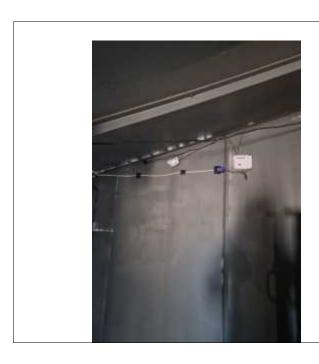





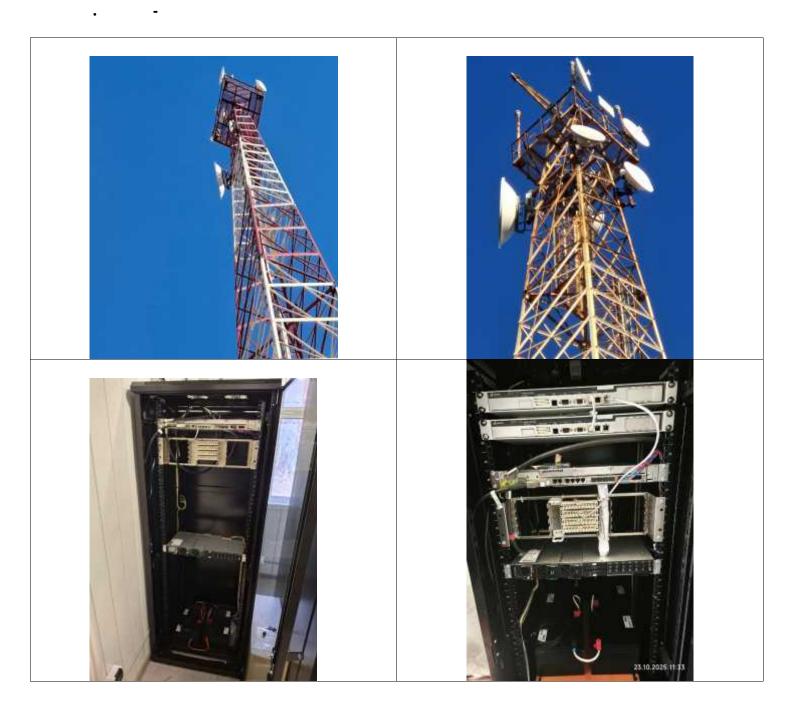

:









3. « »(AO « »)- (TOO « - »)









4. (TOO « - ») - .

















